

5º - Relatório de obra

- Dados da obra:
 - Câmara Municipal de Pindorama
 - Endereço – Antônio Gonçalves, nº 138
 - Início da obra – 07/04/2025

Data do relatório – 09/05/2025

- Atividades executadas no período
 - Muro de divisa
 - Assentamento de alvenaria
 - Chapisco
 - Reboque
 - Corte e dobra da armação da estrutura do prédio principal
 - Início e finalização das estacas hélices contínuas
 - Retirada de terra e concreto provenientes da furação das estacas hélice contínua
 - Foi entregue a primeira medição
- Observações:
 - Foram feitas 4 brocas a mais para reforço

- Uma estaca perfurada pegou o tubo de água pluvial de concreto existente falado em relatórios anteriores. A máquina foi incapaz de perfurar o tubo de concreto. Então modificamos a estaca de lugar para que a mesma não fosse de encontro ao tubo. Dito isto, a parte superior do tubo de concreto foi rompida. Iremos escavar até a parte do tubo para executar uma caixa ao em torno dele e consertar o mesmo. Para que assim, não haja nenhum problema com a tubulação do vizinho que foi despejada neste tubo.
- Total de concreto utilizado nas estacas: 98,00 m³
- Fotos da obra


















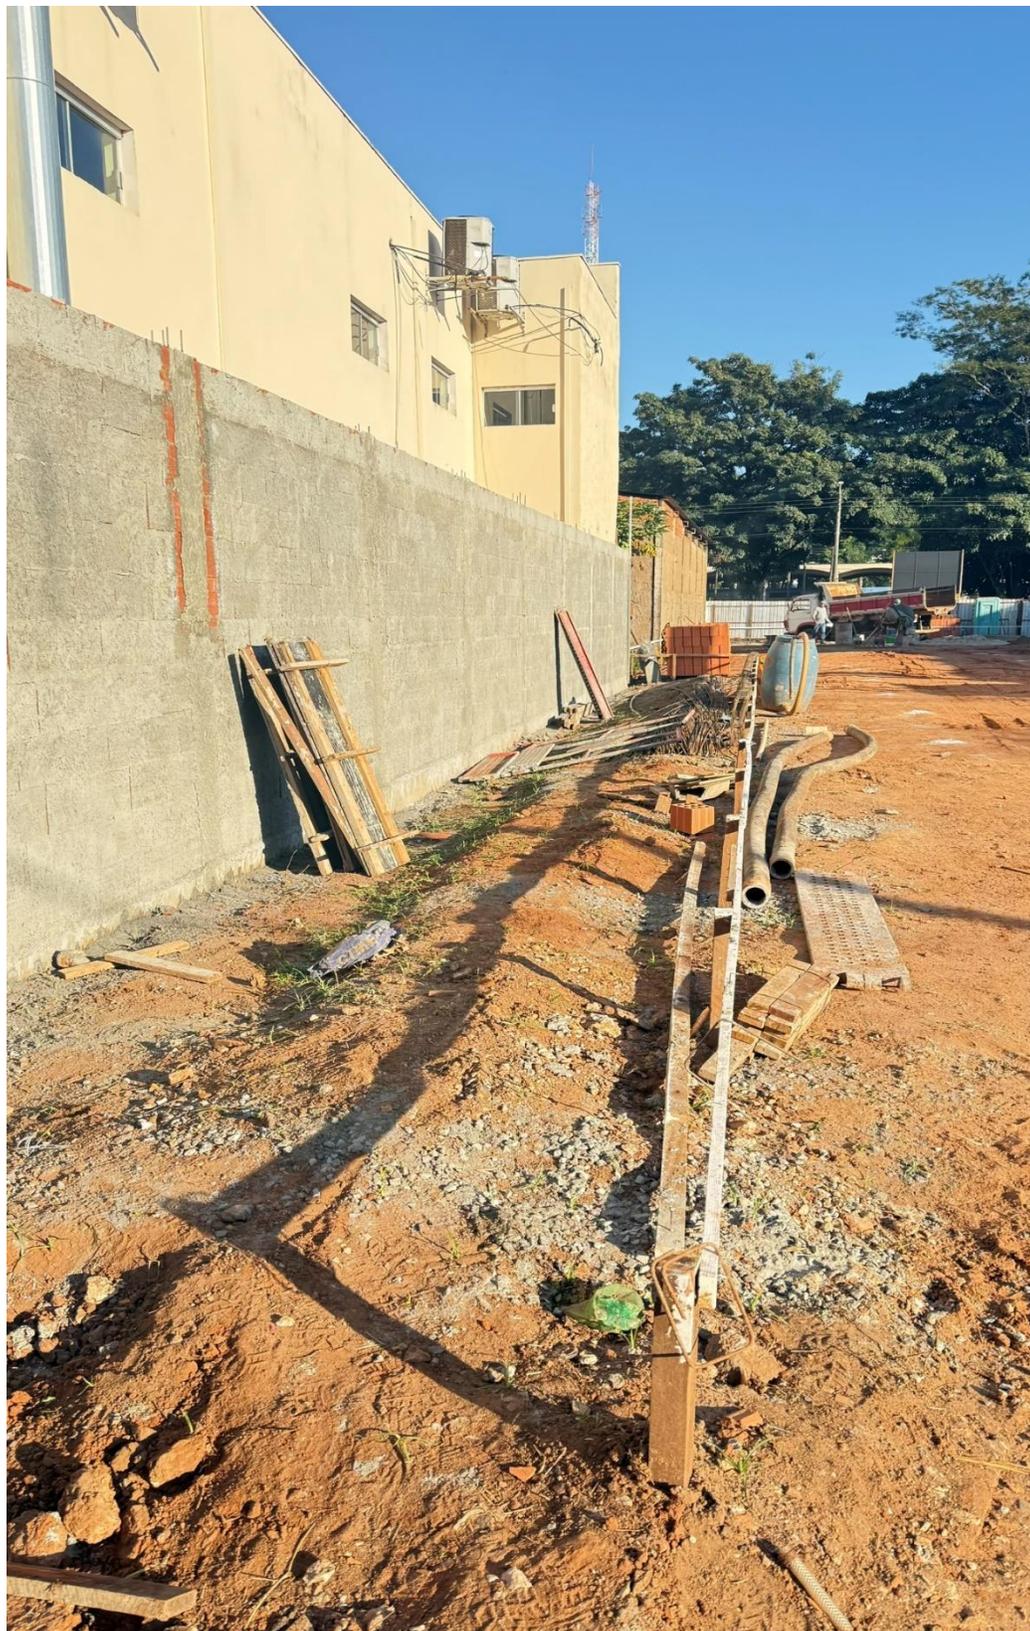









S.A. engenharia

RECIBO DE ENTREGA DE
DOCUMENTO


ESTAMOS ENTREGANDO A CÂMARA MUNICIPAL DE
PINDORAMA O SEGUINTE DOCUMENTO, DO CONTRATO 003/2025 DO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA, Nº 001/2024.

NOTA FISCAL
Nº 956 – R\$ 187.345,63 – 1ª MEDIÇÃO

CATANDUVA, 07 DE MAIO DE 2025



S.A. engenharia


CÂMARA MUNICIPAL DE PINDORAMA
NOME: *Julia Fernanda de Oliveira*
