

9º - Relatório de obra

- Dados da obra:
 - Câmara Municipal de Pindorama
 - Endereço – Antônio Gonçalves, nº 138
 - Início da obra – 07/04/2025

Data do relatório – 06/06/2025

- Atividades executadas no período
 - Finalização da alvenaria de embasamento
 - Assentamento de tijolo
 - Massa de fundo
 - Impermeabilização
 - Acerto e compactação de terra
 - Execuções de:
 - Vigas intermediárias
 - Forma de vigas e pilares
 - Canaletas para travamento de paredes
 - Descidas de tubos de 4" para água pluvial
 - Concretagem das canaletas, vigas e pilares
 - Assentamento de alvenaria de bloco cerâmico

- Observações:
 - Execução da laje para tampar a parte superior do tubo de concreto.
Foi feito o reaterro compactado e foi executada a viga baldrame.
 - A pedido do engenheiro fiscal Estevam, foi executado canaletas concretadas com ferragem a cada 1,00m nas paredes internas.
 - Foi decidido em obra, juntamente com o engenheiro fiscal Estevam de aumentar a quantidade de saída de água pluvial para evitar futuros problemas em relação a escoamento da água de chuva.
Foram colocados ao todo 10 descidas de 4" de água (5 de cada lado do prédio) e mais 1 descida para o pergolado frontal.

- Fotos da obra:



Escavação e laje executada para fechamento do tubo de concreto existente.






ALEXANDRE MANFRIN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA.

AV. DEP. ORLANDO ZANCANER, 1.205 - CEP 15.801-120
CATANDUVA / SP

FONE: (17) 3522-1561

e-mail: saengenharia@saengenharia.com.br

CREA:110.820-3

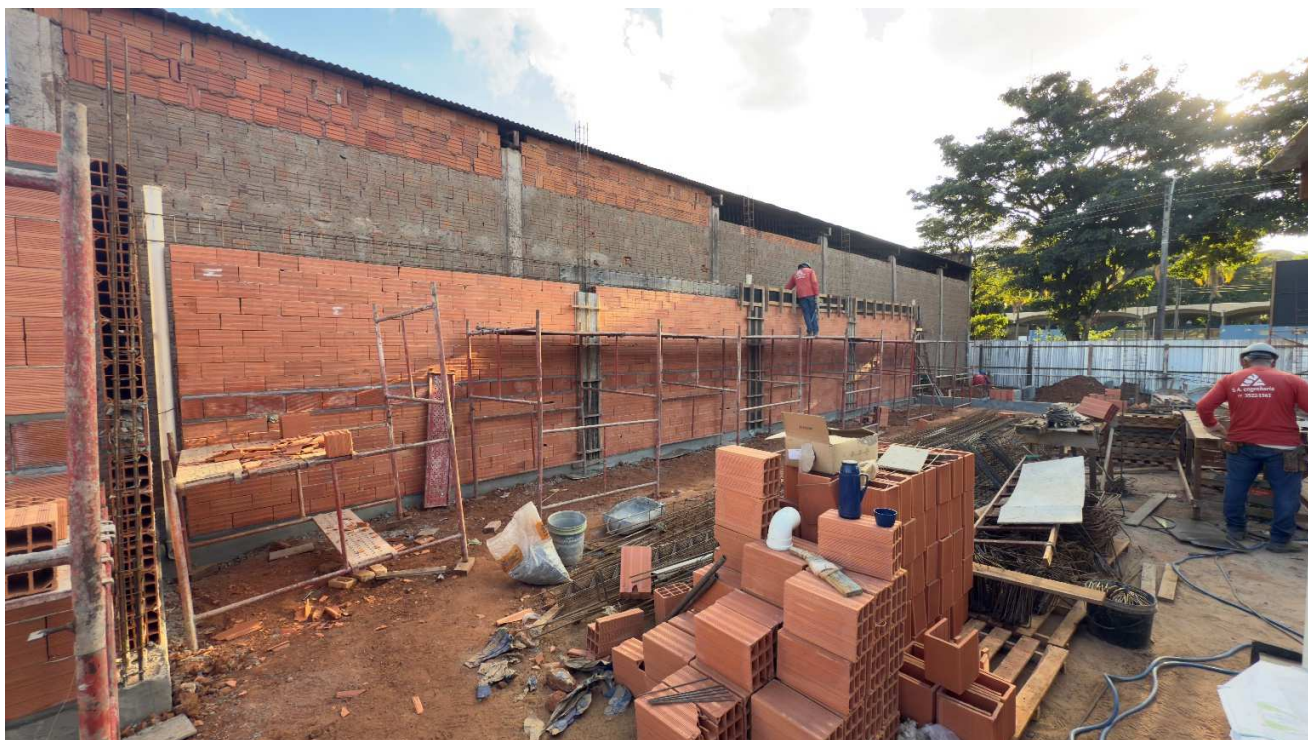





ALEXANDRE MANFRIN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA.

AV. DEP. ORLANDO ZANCANER, 1.205 - CEP 15.801-120
CATANDUVA / SP

FONE: (17) 3522-1561

e-mail: saengenharia@saengenharia.com.br

CREA:110.820-3



ALEXANDRE MANFRIN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA.

AV. DEP. ORLANDO ZANCANER, 1.205 - CEP 15.801-120

CATANDUVA / SP

FONE: (17) 3522-1561

e-mail: saengenharia@saengenharia.com.br

CREA:110.820-3







